

Protocolo 279/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 15/03/2024 às 09:45:17

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Indicação

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0131/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 93/2024, de autoria do ilustre vereador, Eng. Celso Silva (Republicanos), em resposta, vimos encaminhar, o Ofício nº 0339/2024-GP/PMC, anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Notificacao_04_CA_095_2023.pdf

Oficio_n_0339_2024_GP_PMC.pdf




NOTIFICAÇÃO 04

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, através da Assessoria Técnica I, referente ao Contrato Administrativo nº 095/2023 - PGM, que tem como objeto a execução de obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização viária e calçada com acessibilidade, totalizando 10.926,03 metros quadrados de pavimentação, nas ruas Tuiuiús (bairro Vila Mariana), Travessa da Luz (bairro Jardim Celeste), Ruas Avestruz, Guaíra, dos Passos, dos Duarte (bairro Jardim São Luiz da Ponte) e Ruas Flamengo, Botafogo e Travessa Fluminense (bairro Santa Cruz), no Município de Cáceres, vem, por meio desta notificação, expor a seguinte questão à contratada:

1. Atraso significativo na execução da obra, ultrapassando em muito o prazo estabelecido no contrato e no aditivo 01.

Mês	Planejado		Realizado	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado
1	7,69%	7,69%	0,00%	0,00%
2	3,25%	10,94%	0,00%	0,00%
3	15,60%	26,53%	0,00%	0,00%
4	15,72%	42,26%	15,41%	15,41%
5	15,72%	57,98%	9,13%	24,54%
6	15,93%	73,91%	14,37%	38,91%
7	13,79%	87,70%	13,96%	52,87%
8	12,30%	100,00%		

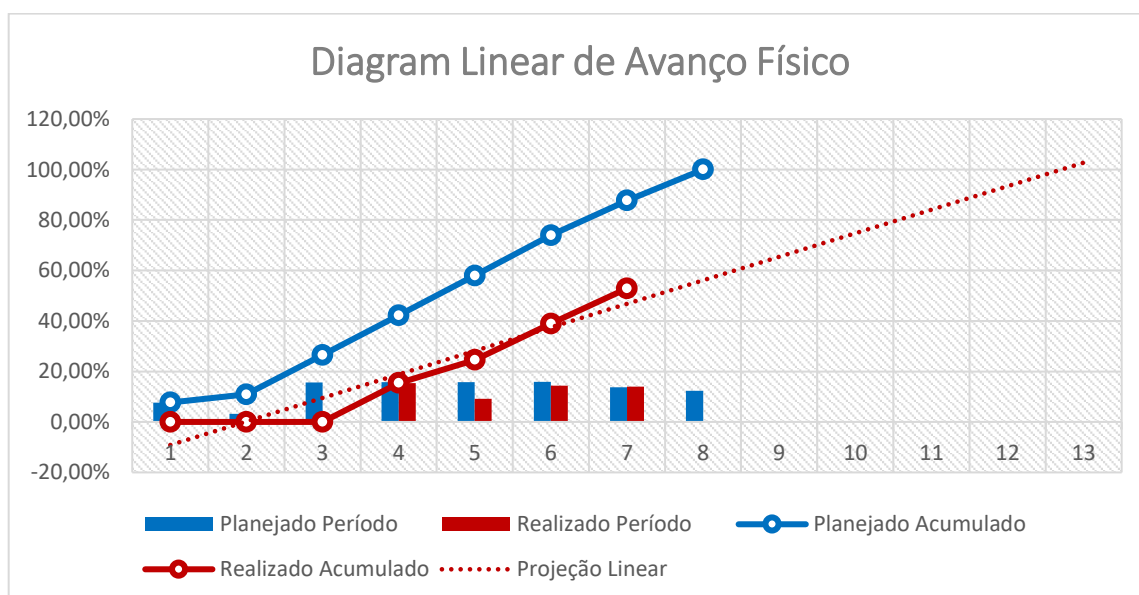



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESORIA TÉCNICA I

2. Falta de medidas proativas por parte da empresa para reestabelecer o ritmo da obra e cumprir o cronograma estabelecido.
3. Execução de bocas de lobo em desacordo com o projeto e orçamento contratados, não atendendo a altura mínima prevista em projeto.
4. Declividade longitudinal em desacordo ao projeto topográfico nas vias Flamengo, Fluminense, Botafogo e Tuiuiús.

Medidas Solicitadas:

1. Apresentação de um plano detalhado de ação, no prazo de 3 dias a partir da recepção desta notificação, explicando como a empresa pretende corrigir as falhas de execução da obra e atender ao cronograma previamente acordado.
2. Adoção de medidas concretas para acelerar a execução de forma a minimizar os atrasos existentes.
3. Revisão e adequação das bocas de lobo executadas em desacordo com o projeto e orçamento, garantindo a conformidade com os termos do contrato.
4. Justificativa formal por parte da empresa, explicando os motivos que levaram ao atraso excessivo na execução da obra.

Solicitamos que a IDEAL CONSTRUTORA LTDA apresente respostas e ações claras para os itens mencionados acima, a fim de garantir a continuidade do contrato e o cumprimento das obrigações contratuais.

A falta de medidas adequadas e respostas satisfatórias dentro do prazo estipulado poderá resultar em ações legais, incluindo a rescisão do contrato e/ou aplicação de penalidades financeiras.

Cáceres – MT, 19 de dezembro de 2023.

ANDREY PABLO
MACHADO:0356
4806156

Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156
Dados: 2023.12.19 15:33:08
-04'00'

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil / Fiscal de Obra



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0339/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 14 de março de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 5.658/2024

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0131/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 93/2024, de autoria do ilustre vereador, **Eng. Celso Silva** (Republicanos), que indica a notificação de empresa responsável, para a retomada e conclusão da obra de pavimentação da Travessa da Luz e outras vias, de sua responsabilidade.

Em atendimento à referida propositura, vimos encaminhar a Vossa Excelência a Notificação nº 04, de 19 de dezembro de 2023, destinada à Empresa a Ideal Construtora Ltda, cópia anexa.

Destaque-se, ainda, que a mencionada Empresa, em contato com a equipe técnica de fiscalização desta Prefeitura, comprometeu-se a retomar a obra em ritmo acelerado e corrigir as falhas decorrentes de erros de execução.

Contudo, é importante ressaltar que a equipe de fiscalização estará atenta à retomada do ritmo da obra e às correções necessárias. Caso seja necessário, far-se-á a rescisão contratual.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BE5-5408-A035-DFB1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 14/03/2024 18:27:36 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9BE5-5408-A035-DFB1>

Protocolo 1- 279/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 15/03/2024 às 10:19:44

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 131/2024-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia da Indicação 93/2024, de autoria do Vereador Engº Celso Silva.

—

Henrique Barcelos Moraes

DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA
